



DATOS DEL CLIENTE:

NOMBRE: CR ALAMEDA DE SANTA CLARA I PH

NIT:

DIRECCION: CLL 146 NO. 58 C – 21

OBRA: INSTALACION CERCA ELECTRICA

ACTA DE ENTREGA DE OBRA

A los once (11) días del septiembre de 2024, mediante el presente documento, se formaliza la entrega oficial de la instalación de la cerca eléctrica perimetral en el conjunto residencial Alameda Santa Clara I.



El trabajo se llevó a cabo según el procedimiento descrito a continuación.

- * Mantenimiento y puesta en marcha de cerco eléctrico
- * Limpieza de cerco
- * Lijado de alambre de cerco para mejor conducto
- * Fabricación e instalación de postes para cerco
- * Instalación de línea de 340 Mt con alambre calibre 14 para polo a tierra
- * Suministro e instalación de aisladores
- * Suministro e instalación de tensores
- * Ajustar cuerda
- * Instalación de varilla polo a tierra
- * Suministro e instalación de cableado encauchetado para conexión.
- * Suministro e instalación de equipo energizador de cerco eléctrico hagroy
- * Instalación independiente a tablero eléctrico de 110
- * Puesta en marcha de equipo
- * Pruebas de entrega a administración consejo administrativo y empresa de seguridad





JESUS SEGURA
Contractista
Construcción & Remodelacion

EVIDENCIAS

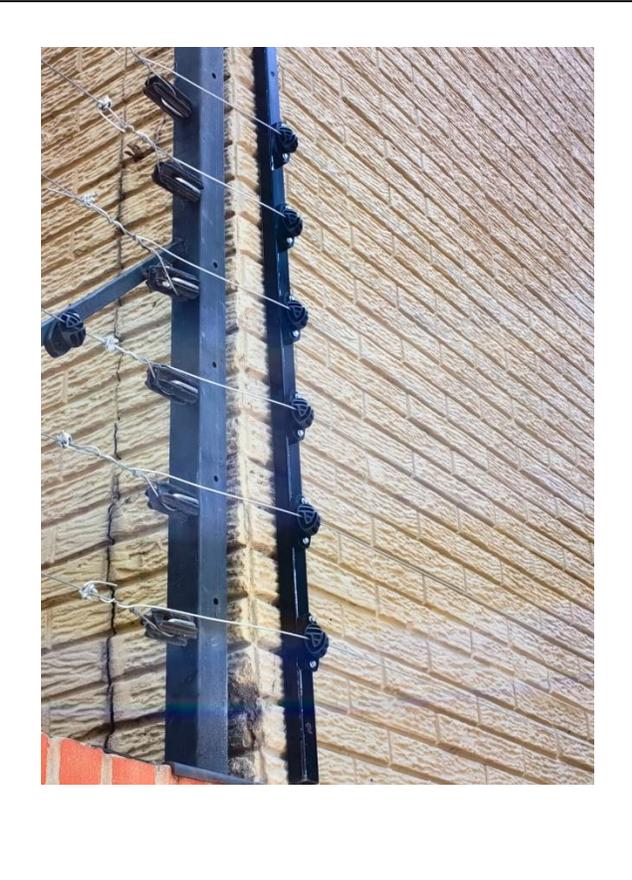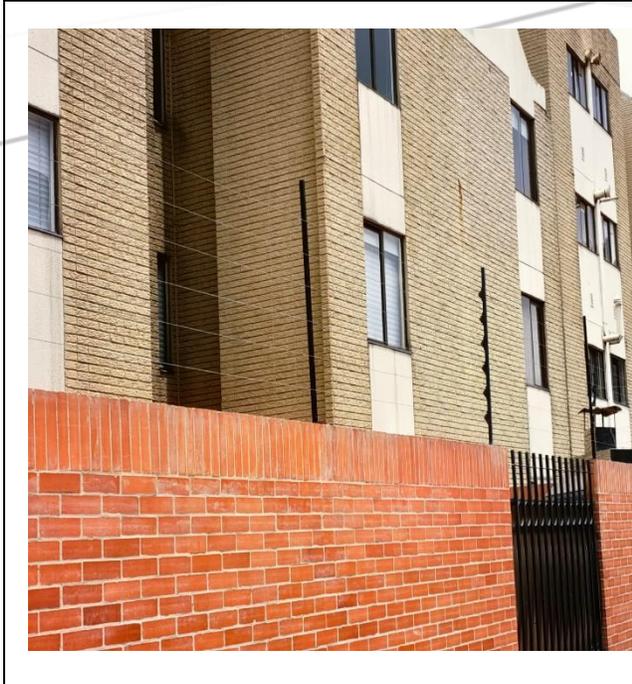



JESUS SEGURA
Contractista
Construcción & Remodelacion

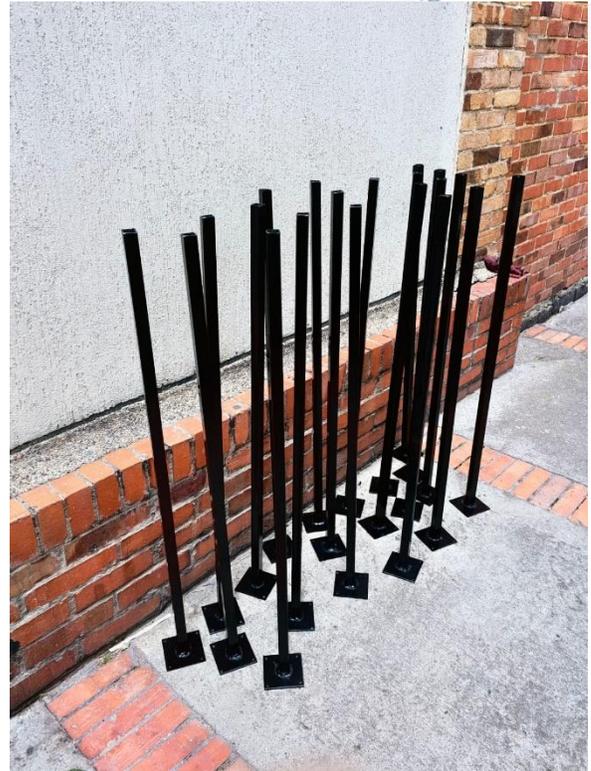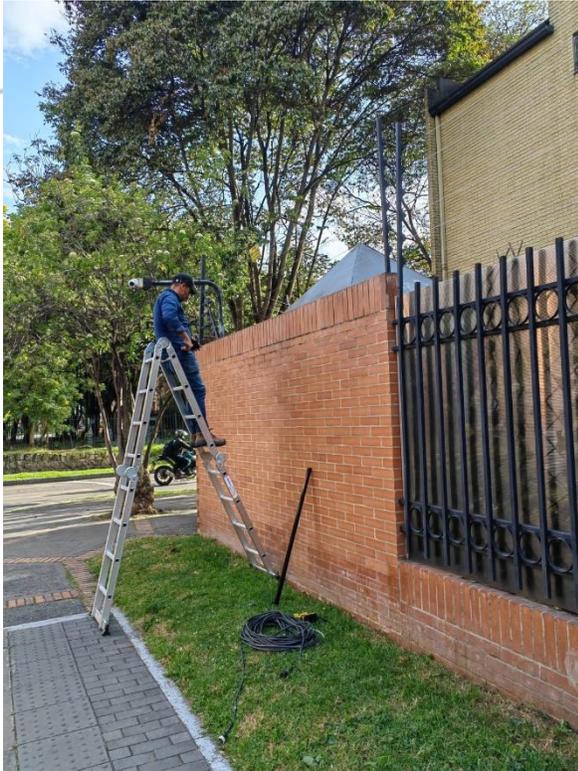



JESUS SEGURA
Contractista
Construcción & Remodelacion





JESUS SEGURA
Contractista
Construcción & Remodelacion





PORCENTAJE DE LA OBRA: 100%

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñada por cada uno de los mismos.

JESUS ALFONSO SEGURA
Contratista

BLANCA ELENA PARRA SANCHEZ
Administradora

JESUS SEGURA

Celular: 318 – 4656414
Email: paez.jex@hotmail.com
NIT: 80173897 – 2
